

Totally Integrated Automation Portal

Main Properties

General

Name	Main	Number	1	Type	OB	Language	LAD
Numbering	Automatic						

Information

Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Network 1:

Este bloque debe ser el primero en ser ejecutado, él dará el feed para validar la logica.

%FC1

"FC_InputInterface"

EN

ENO

Network 2:

Es importante que este bloque sea ejecutado antes de la logica de validacion individual de cada alarma y antes de FC_InputInterface

%DB5

"FB_Alarms Handling_DB"

%FB5

"FB_AlarmsHandling"

EN

ENO

Network 3:

%FC10

"FC_InterfaceConnection_HMI"

EN

ENO

Network 4:

%DB1

"FB_E156_DB"

%FB1156

"FB_E156"

EN

ENO

Network 5:

%DB155

"FB_RB155_DB"

%FB155

"FB_RB155"

EN

ENO

Network 6:

%DB2

"FB_RB156_DB"

%FB156

"FB_RB156"

EN

ENO

Network 7:




Network 8:



Network 9: En este bloque hacemos un put al plc_2 y al plc_0

Falta el get en este caso no tengo ninguna cpu asi que me daría fualt, elegi no implementarla por ahora

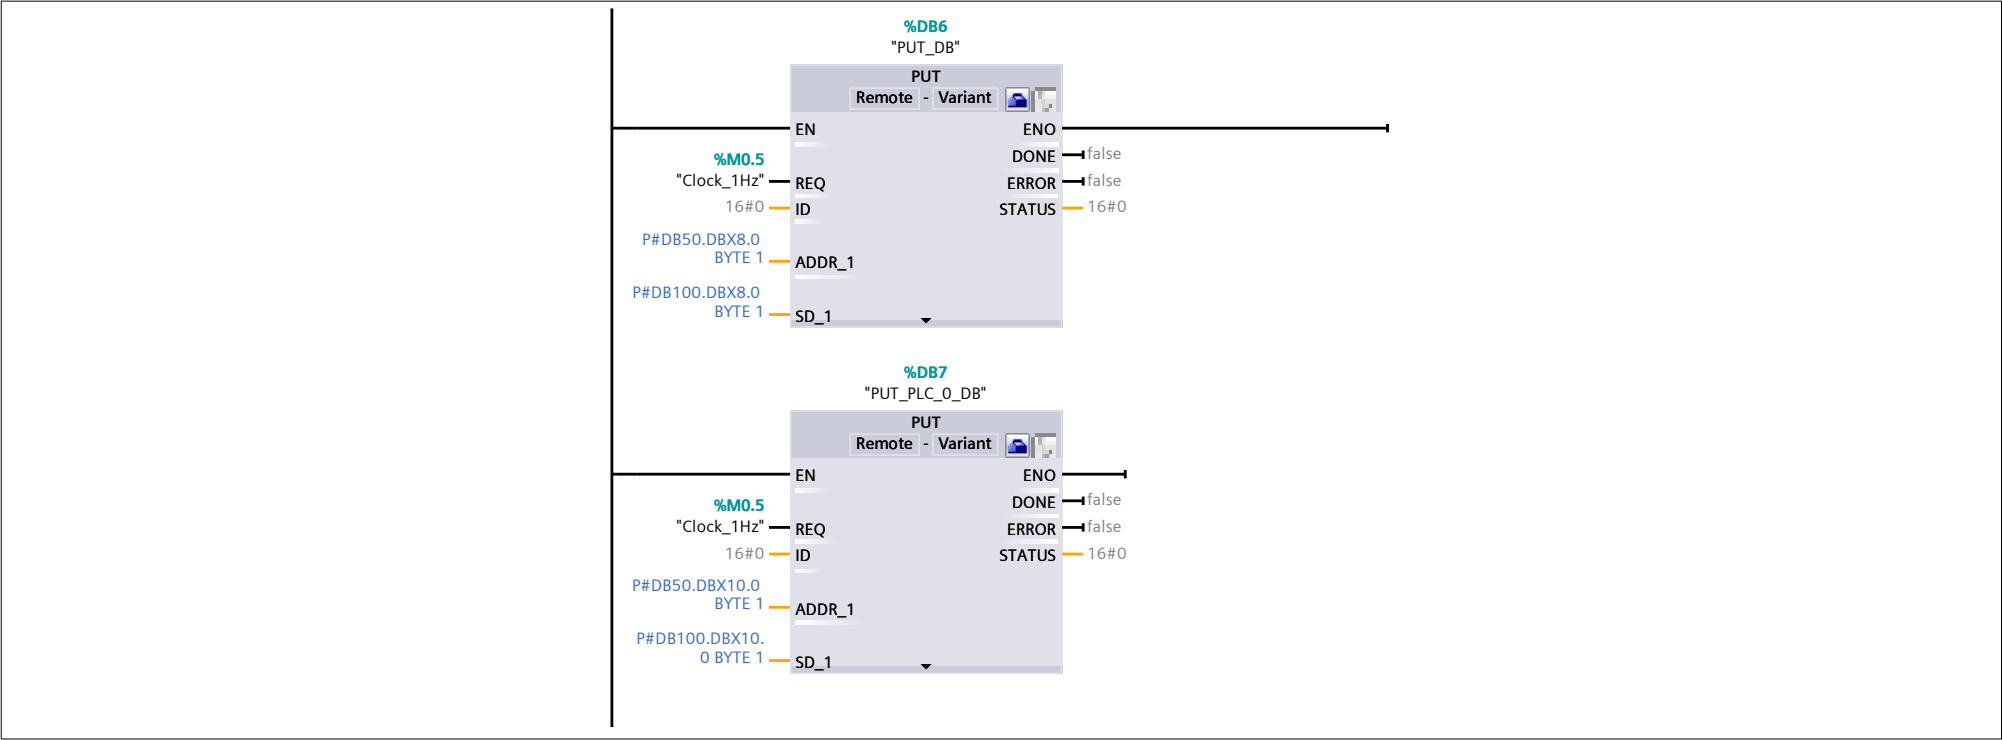

Network 10:

Este bloque debe ser ejecutado al ultimo, este es el encargado de escribir la salidas, y esto se debe hacer luego de la logica del programa.

